


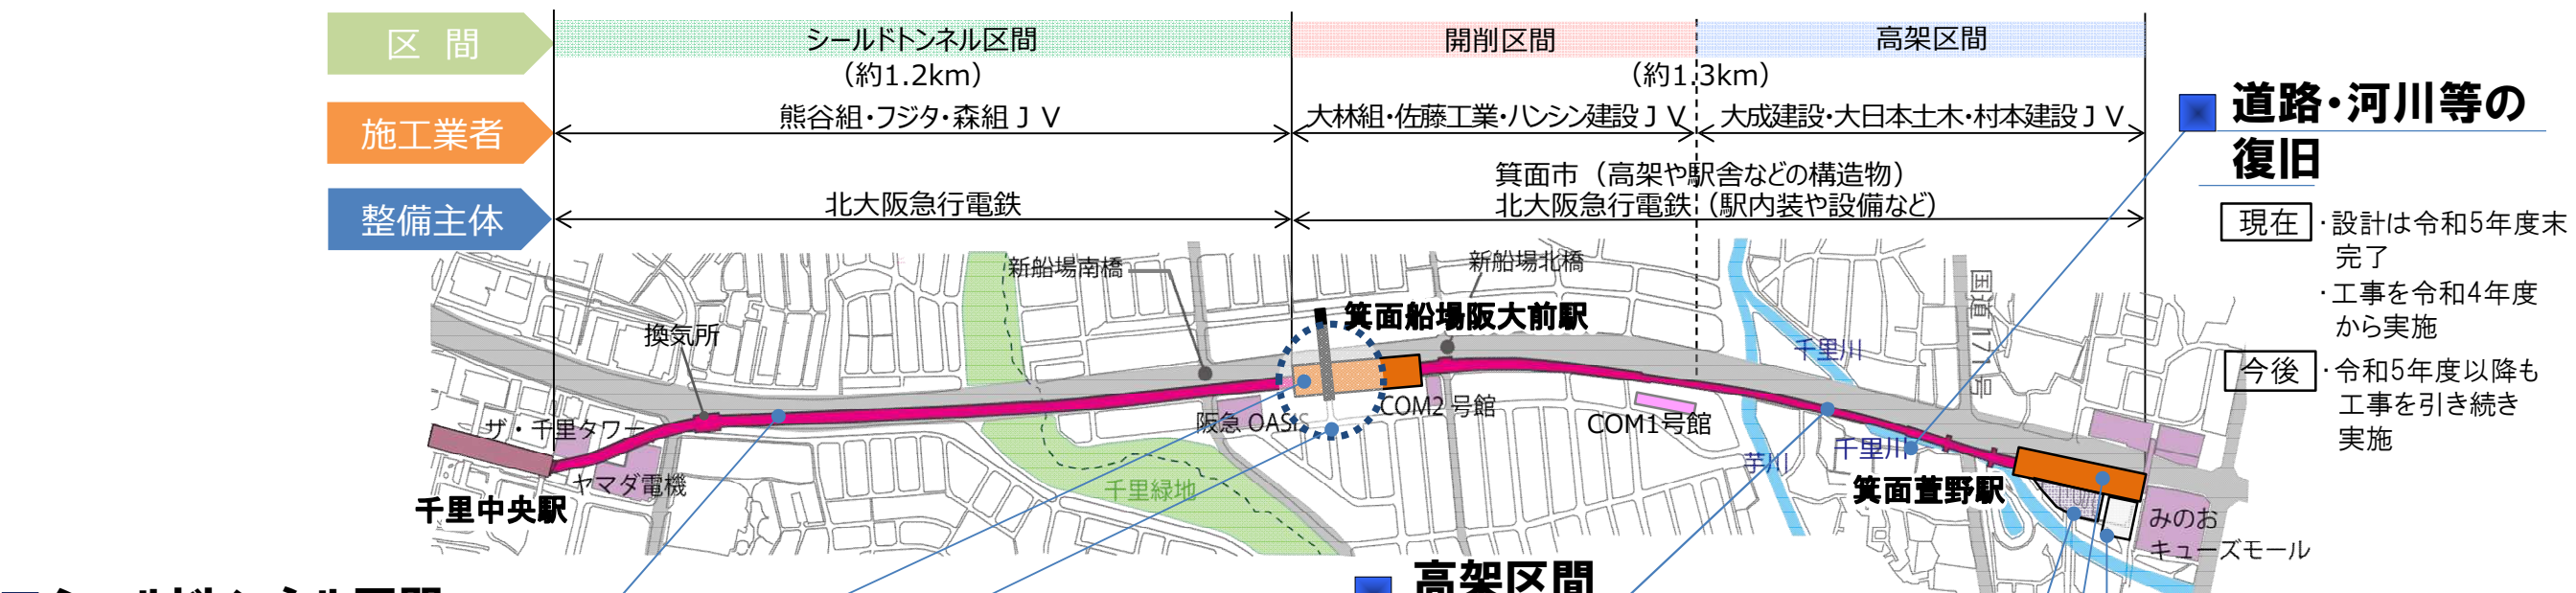


シールドトンネル区間

- 現在** ・構造物をつくる工事は令和4年度竣工
- ・軌道、設備等の工事を実施
- 今後** ・令和6年3月に竣工

箕面船場阪大前駅(地下駅本体)

- 現在** ・構造物をつくる工事は令和4年度竣工
- ・内装、軌道、設備等の工事を実施
- 今後** ・令和6年3月に竣工

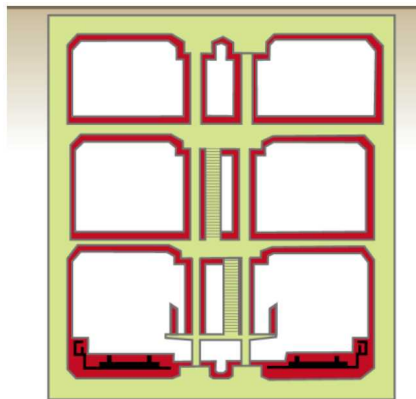

■ 箕面市施工(構造物)

■ 北大阪急行電鉄施工(内装・軌道・設備)

箕面船場阪大前駅の交通施設

箕面船場駐車場

- 現在** ・令和元年度から工事を実施
- ・令和3年4月に竣工
- ・令和3年5月より供用開始

箕面船場第一駐輪場

- 現在** ・令和2年度から工事を実施
- ・令和3年4月に竣工
- ・令和3年5月より供用開始

箕面船場第二駐輪場

- 現在** ・令和3年度から工事を実施
- ・令和5年12月に竣工
- ・令和6年2月より供用開始

エントランス

- 現在** ・令和3年度から工事を実施
- ・令和5年12月に竣工
- ・令和6年1月より地上部と2階を供用開始
- 今後** ・令和6年3月より地下部を供用開始予定

歩行者デッキ


- 現在** ・令和元年度から工事を実施
- ・令和5年12月に竣工
- ・令和6年1月より供用開始

高架区間

- 現在** ・構造物をつくる工事は令和4年度竣工
- ・軌道、設備等の工事を実施
- 今後** ・令和6年3月に竣工

■ 箕面市施工(構造物)

■ 北大阪急行電鉄施工(軌道・設備)

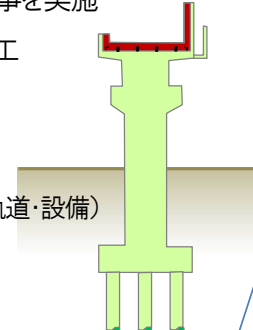

箕面萱野駅の交通施設

交通広場 (バス乗り場など)

- 現在** ・令和2年度末から詳細設計を実施
- ・令和4年度から工事を実施
- 今後** ・北側交通広場を令和6年2月に竣工予定
- ・南側交通広場を令和6年度末に竣工予定
- ・令和6年3月より北側交通広場を供用開始予定
- ※新駅開業後から南側交通広場の竣工までの間は、仮設身障者等用乗降場、仮設タクシー乗り場にて運用予定

駐輪場 (地下・新御堂筋高架下)


- 現在** ・令和2年度末から詳細設計を実施
- ・令和4年度から工事を実施
- 今後** ・新御堂筋高架下駐輪場を令和6年2月に竣工予定
- ・地下駐輪場を令和6年度末に竣工予定
- ・令和6年3月より新御堂筋高架下駐輪場を供用開始予定
- ※新駅開業後から地下駐輪場の竣工までの間は、仮設駐輪場にて運用予定

駅ビル

- 現在** ・令和3年4月に交通広場上空の立体利用施設整備事業者を決定
- ・令和4年度から工事を実施
- 今後** ・令和6年2月に竣工予定

箕面萱野駅(駅舎本体)

- 現在** ・構造物をつくる工事は令和4年度竣工
- ・内装、軌道、設備等の工事を実施
- 今後** ・令和6年3月に竣工

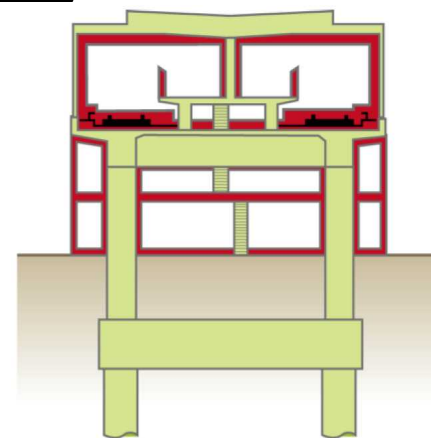

■ 箕面市施工(構造物)

■ 北大阪急行電鉄施工(内装・軌道・設備)


今後の予定（新駅周辺のまちづくりと鉄道延伸）

			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度												令和6年度											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新駅周辺のまちづくり	箕面萱野まちづくり	北交通広場（バス乗り場） 第二駐輪場（新御堂筋高架下） 第三駐輪場（新御堂筋高架下）			工事												竣工												
		南交通広場（タクシー乗降場） 区画道路 第一駐輪場（地下）	詳細設計																										竣工
		都市計画道路（萱野東西線、芝如意谷線）	用地取得																										
	船場まちづくり	P第1期 駐車場 新文化ホール 生涯学習センター 図書館	工事	竣工																									
		P第2期 第一駐輪場（デッキ下） 地区内デッキ	工事	竣工																									
		駅前広場			工事																								竣工
		エントランス 第二駐輪場（駅舎）		工事																									竣工
		歩行者デッキ																											竣工
			工事																										竣工
鉄道延伸工事	高架区間 箕面萱野駅～COM1号館付近	土木工事（駅舎本体、高架橋）			竣工																								竣工
																													竣工
																													竣工
	開削区間 COM1号館付近～箕面船場阪大前駅	土木工事（地下駅本体、地下トンネル）			竣工																								竣工
																													竣工
																													竣工
	シールドトンネル区間 箕面船場阪大前駅～千里中央駅																												竣工
		土木工事（シールドトンネル）																											竣工
																													竣工
	車両																												

交通対策特別委員会（工事進捗報告）

令和6年度当初予算案の提出（継続費）

<箕面船場阪大前駅周辺>

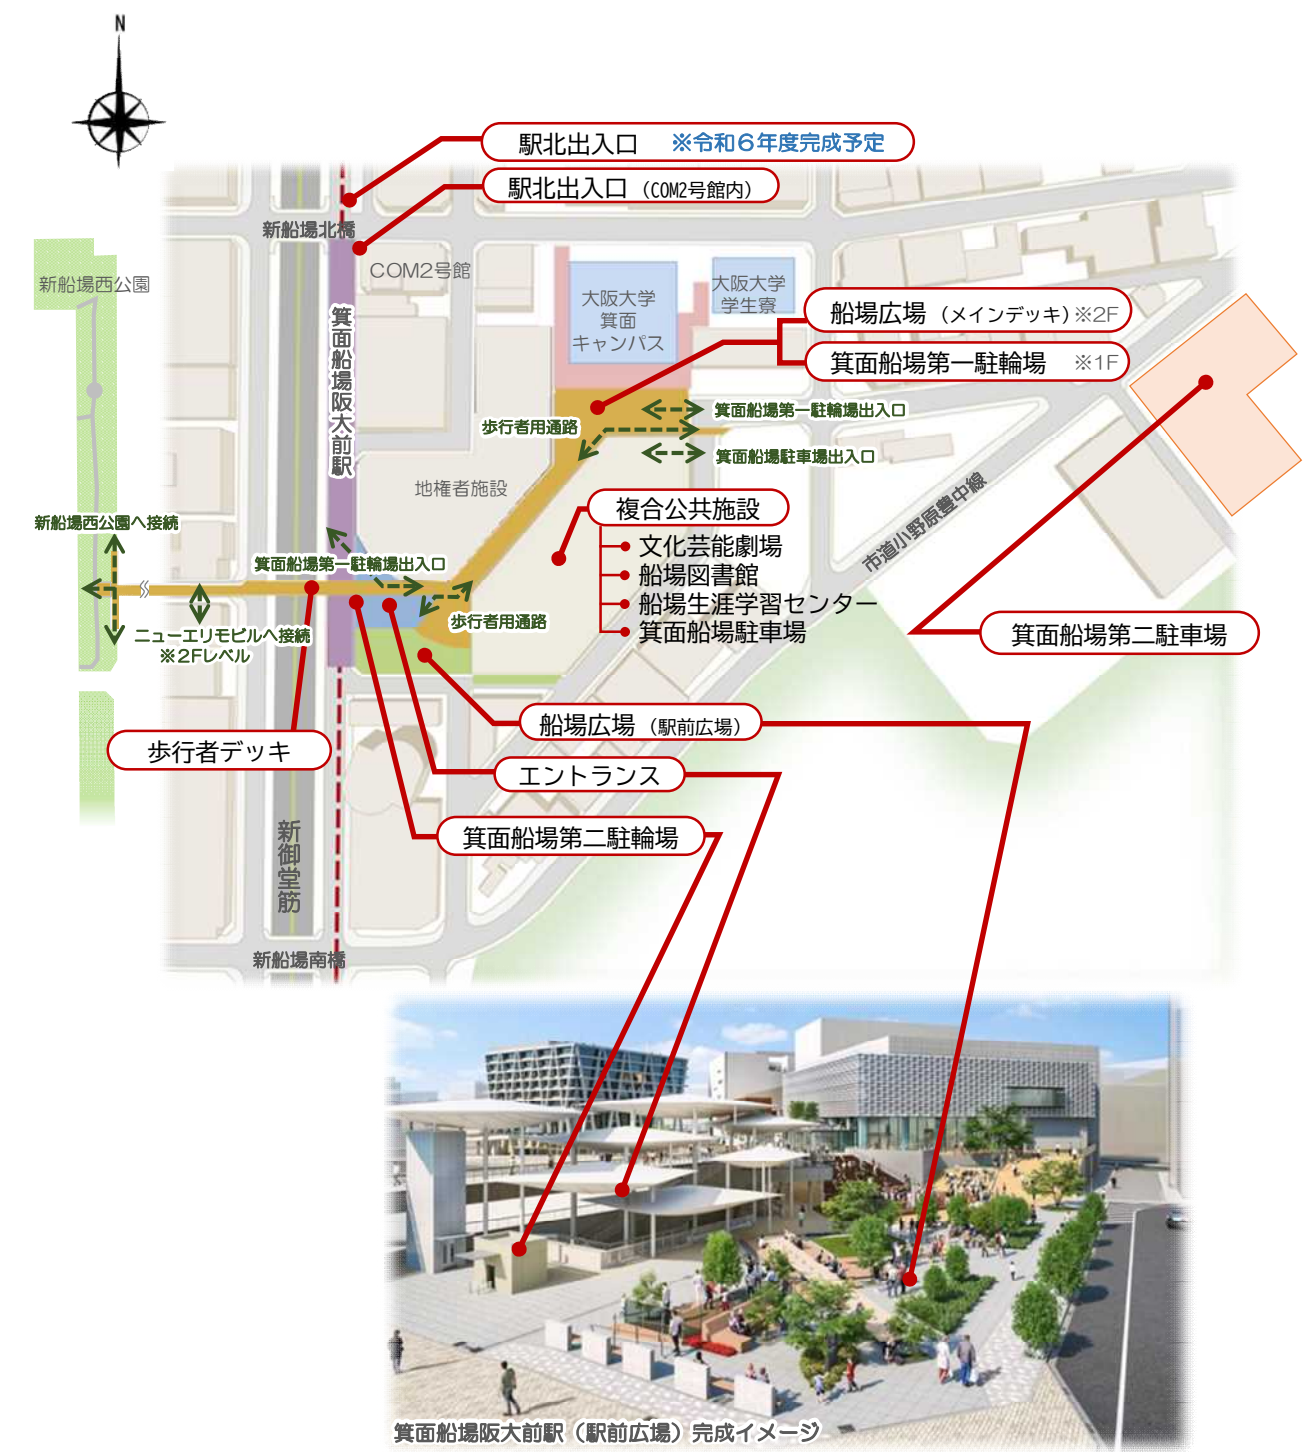

<箕面萱野駅周辺>

