


■ シールドトンネル区間

- 現在**
 - ・土留め壁撤去工事を実施
 - ・軌道、設備等の設計・工事を実施
- 今後**
 - ・土留め壁撤去工事を引き続き実施するとともに、令和3年度から再度構造物をつくる工事を実施予定
 - ・軌道、設備等の設計・工事を令和3年度以降も引き続き実施予定

■ 箕面船場阪大前駅(地下駅本体)

- 現在**
 - ・構造物をつくる詳細設計・工事を実施
 - ・内装、軌道、設備等の設計を実施
- 今後**
 - ・構造物をつくる工事を引き続き実施予定
 - ・設備等の設計・工事を令和3年度以降も引き続き実施予定

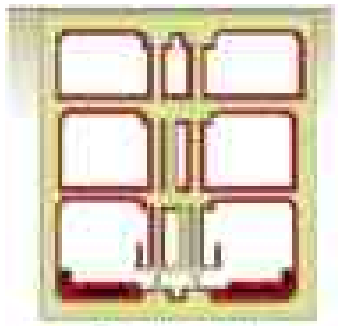

■ 箕面市施工(構造物)
■ 北大阪急行電鉄施工(内装・設備)

■ 箕面船場阪大前駅の交通施設

■ 箕面船場駐車場

- 現在**
 - ・令和元年度から工事を実施
- 今後**
 - ・令和3年4月に竣工予定

■ 箕面船場第一駐輪場

- 現在**
 - ・令和2年度から工事を実施
- 今後**
 - ・令和3年4月に竣工予定

■ 箕面船場第二駐輪場

- 現在**
 - ・市施行で整備し、PFI手法で運営することを決定
 - ・令和元年度にPFI事業者を決定
- 今後**
 - ・令和3年度以降に市施行で工事予定

■ エントランス


- 現在**
 - ・平成29年度に委託事業者を決定
 - ・平成30年度に詳細設計を実施
- 今後**
 - ・令和3年度以降に工事予定

■ 歩行者デッキ

- 現在**
 - ・令和元年度から工事を実施
- 今後**
 - ・令和4年春に竣工予定

■ 高架区間

- 現在**
 - ・構造物をつくる工事を実施
 - ・軌道、設備等の設計を実施
- 今後**
 - ・構造物をつくる工事を引き続き実施予定
 - ・設備等の設計・工事を令和3年度以降も引き続き実施予定



■ 箕面市施工(構造物)
■ 北大阪急行電鉄施工(設備)

■ 箕面萱野駅の交通施設

■ 交通広場 (バス乗り場など)

- 現在**
 - ・事業手法を見直し、市施行で整備することを決定
- 今後**
 - ・令和2年度末から詳細設計を実施予定
 - ・令和4年度以降に工事予定

■ 駐輪場 (地下・新御堂筋高架下)

- 現在**
 - ・事業手法を見直し、市施行で整備することを決定
- 今後**
 - ・令和2年度末から詳細設計を実施予定
 - ・令和4年度以降に工事予定



■ 箕面市施工(構造物)
■ 北大阪急行電鉄施工(内装・設備)

■ 駅ビル

- 現在**
 - ・バス乗り場上空の立体利用提案を募集中
- 今後**
 - ・令和3年度に事業者を決定
 - ・令和4年度以降に工事予定

■ 箕面萱野駅(駅舎本体)

- 現在**
 - ・構造物をつくる工事を実施
 - ・内装、軌道、設備等の設計を実施
- 今後**
 - ・構造物をつくる工事を引き続き実施予定
 - ・設備等の設計・工事を令和3年度以降も引き続き実施予定
